



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2017 - Año de las Energías Renovables

**Hoja Adicional de Firmas
Convenio firma ológrafa**

Número: CONVE-2017-03844408-APN-SECVYH#MI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Jueves 16 de Marzo de 2017

Referencia: EXP-S02:0125784/2016 - SANTA CRUZ - RIO GALLEGOS - PROYECTO 8 - 35
VIVIENDAS E INFRA

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 16 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION,
ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT 30715117564
Date: 2017.03.16 19:22:55 -03'00'

Domingo Luis Amaya
Secretario
Secretaría de Vivienda y Hábitat
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUIT
30715117564
Date: 2017.03.16 19:22:56 -03'00'

CONVENIO ESPECÍFICO PARA LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
DE ACUERDO CON EL CONVENIO MARCO DE CONSTRUCCIÓN DE
VIVIENDAS, URBANIZACIÓN DE BARRIOS VULNERABLES Y
MEJORAMIENTO DEL HÁBITAT
PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS
“TECHO DIGNO”

En la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, a los ¹³ días del mes de ^{Marzo}...
de 2017, entre la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT del MINISTERIO
DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en adelante “LA
SECRETARÍA”, representada por el Cdor. Domingo Luis AMAYA, DNI N°
12.562.201 con domicilio legal en Esmeralda N° 255, Piso 8, de la Ciudad
Autónoma de Buenos Aires, por una parte y el INSTITUTO PROVINCIAL DE
DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia de SANTA CRUZ, en
adelante “EL INSTITUTO”, representado por el Presidente Sr. Pablo Miguel
Ángel GRASSO, DNI N° 25.250.229 con domicilio legal en la calle Don Bosco
N° 369, en Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, por la otra parte,
conjuntamente denominadas “LAS PARTES”, acuerdan celebrar el presente
CONVENIO, a los efectos de incluir obras en el PROGRAMA FEDERAL DE
CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS “TECHO DIGNO” (en adelante “EL
PROGRAMA”), en base a las cláusulas y condiciones establecidas en el
Reglamento Particular del Programa, aprobado por Resolución de la entonces
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS N° 428/2009 de fecha 22 de abril de
2009 y su normativa complementaria, como así también en base a lo dispuesto
en el Convenio Marco de Colaboración entre el MINISTERIO DEL INTERIOR,
OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, en adelante “EL MINISTERIO”, la
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT Y LA PROVINCIA DE SANTA CRUZ
para la construcción de viviendas, urbanización de barrios vulnerables y
mejoramiento del hábitat de fecha 18 de Mayo de 2016 (Número de Protocolo
0065) y,

CONSIDERANDO:

CONVE-2017-03844408-APN-SECVYH#MI

Que entre las competencias asignadas a EL MINISTERIO por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, se encuentra la de entender en la elaboración y ejecución de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos y promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda.

Que de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 212 del 22 de diciembre de 2015, LA SECRETARÍA tiene entre sus objetivos los de entender en el diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda y entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de obras de infraestructura habitacional y de desarrollo urbano.

Que se ha determinado la factibilidad técnica y urbanística de la solicitud presentada por el INSTITUTO PROVINCIAL DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA de la Provincia de SANTA CRUZ, mediante presentación de fecha 10 de Agosto de 2016 y que resulta conveniente que LAS PARTES procedan a la firma del presente CONVENIO que tiene por objeto la ejecución de la obra denominada: Construcción de 35 viviendas más infraestructura – Proyecto N° 08, en la Localidad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz.

Que con fecha 18 de Mayo de 2016 se suscribió entre el MINISTERIO y LA SECRETARÍA, por una parte y la PROVINCIA DE SANTA CRUZ, por la otra, un Convenio Marco de Colaboración en el que las partes se comprometieron a cooperar en el desarrollo y en la implementación de acciones y medidas estratégicas con el objeto de dar solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los centros con déficit de viviendas y de urbanización de barrios vulnerables con infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario, logrando así la revalorización del hábitat. A tal efecto, acordaron desarrollar obras para la construcción de viviendas y la planificación urbana que contemple la transformación físico social en la Provincia y por otro lado, se facultó a LA SECRETARÍA a implementar las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento al Convenio y suscribir los Acuerdos Específicos que resulten pertinentes.

Que el presente Convenio se firma para llevar adelante la ejecución de la obra denominada: Construcción de 35 viviendas más infraestructura – Proyecto N°

CONVE-2017-03844408-APN-SECVYH#MI

08, en la Localidad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz, en el marco del Programa.

En virtud de lo precedentemente expuesto, LAS PARTES acuerdan:

PRIMERA: LAS PARTES suscriben el presente Convenio a los fines de ejecutar la obra denominada "Construcción de 35 viviendas más infraestructura – Proyecto N° 08, en la Localidad de Río Gallegos, Provincia de Santa Cruz", conforme los parámetros establecidos en el Reglamento Particular que rige al "PROGRAMA" y normativa complementaria.-----

SEGUNDA: "EL INSTITUTO" se compromete a respetar estrictamente la documentación y especificaciones técnicas detalladas en las memorias descriptivas de los proyectos que, con carácter de Declaración Jurada, presentó ante "LA SECRETARÍA".-----

TERCERA: "LA SECRETARÍA", se compromete a financiar la ejecución de las obras en función de las disponibilidades presupuestarias existentes. Dicho financiamiento asciende al monto de \$ 37.885.394,67 (PESOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO MIL TRESCIENTOS NOVENTA Y CUATRO CON SESENTA Y SIETE CENTAVOS), de conformidad con el ANEXO II, que forma parte integrante del presente CONVENIO, el cual será desembolsado de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA. "LA SECRETARÍA" remitirá al organismo competente las eventuales redeterminaciones de precios presentadas por "EL INSTITUTO", de conformidad con la normativa vigente.-----

CUARTA: Los plazos de ejecución se fijan en el Plan de Trabajos y en el Cronograma General de Desembolsos que "EL INSTITUTO" acordó con "LA SECRETARÍA" y que como ANEXOS I y II respectivamente, forman parte integrante del presente CONVENIO. "LA SECRETARÍA" realizará un primer desembolso a "EL INSTITUTO" en concepto de adelanto financiero, equivalente al 10% del financiamiento a su cargo, siendo el saldo restante desembolsado contra la presentación de los correspondientes certificados de obra que acrediten la efectiva ejecución de la misma, deduciendo en cada nuevo desembolso el monto proporcional al adelanto financiero recibido. -----

CONVE-2017-03844408-APN-SECVYH#MI

QUINTA: "EL INSTITUTO" informa su CUIT N° 30-65314199-4 y denuncia su cuenta del Banco Nación N° 4330098502 de la Sucursal 2940 de la Provincia de Santa Cruz, en la que se acreditarán los fondos que el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA transferirá en función de lo previsto en la Cláusula CUARTA.-----

SEXTA: "EL INSTITUTO" se compromete a aportar los recursos que fueran necesarios para solventar eventuales diferencias que excedan el monto financiado por "LA SECRETARIA". A tal efecto, "EL INSTITUTO" declara contar con los recursos Municipales suficientes para asegurar la terminación de la obra, en plazo y con las calidades convenidas.-----

SEPTIMA: "EL INSTITUTO" declara mediante el presente Convenio, que no existen impedimentos de orden técnico, legal, administrativo, o de cualquier otro tipo, que obstaculicen el normal inicio de la obra, según el Plan de Trabajos que como ANEXO I se adjunta al presente Convenio Específico.-----

OCTAVA: "EL INSTITUTO" se obliga a mantener indemne al Estado Nacional, de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de la obra o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio y por todas aquellas por las cuales "EL INSTITUTO" deba responder. A tales fines, "EL INSTITUTO" bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la Empresa Contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento del Contrato; b) Seguro de todo Riesgo de Construcción; c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual; d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley 24.557 y sus modificatorias; e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si lo hubiere; f) Seguro de automotores, equipos y máquinas; g) Seguro contra incendio; h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de acuerdo a enseres,

CONVE-2017-03844408-APN-SECVYH#MI

máquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de la obra.-----

NOVENA: "EL INSTITUTO" se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 58 – E/2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y que como ANEXO III forma parte integrante del presente.-----

DÉCIMA: En caso de incumplimiento a la obligación de rendir cuentas en tiempo y forma, "LA SECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación. En caso de que "EL INSTITUTO" no proceda a presentar la rendición de cuentas detallada y debidamente documentada, según lo establecido en el presente CONVENIO, deberá restituir de forma inmediata los montos no rendidos al Estado Nacional, debiendo "EL INSTITUTO" efectuar un depósito por la suma no rendida en la cuenta que "LA SECRETARÍA" indique a tal efecto en el plazo de 30 días de producido el incumplimiento, y se estará en condiciones de rescindir el convenio.-----

DÉCIMA PRIMERA: De verificarse la existencia de atrasos injustificados que superen el VEINTE POR CIENTO (20%) del avance físico acumulado que debería haberse registrado al momento de certificación, "LA SECRETARÍA" podrá suspender el financiamiento hasta tanto se regularice la situación, conforme lo establecido en la normativa vigente.-----

DÉCIMA SEGUNDA: Que ante la posibilidad de que diferentes inconvenientes acontecidos, ajenos a LAS PARTES, produzcan retardos en la ejecución de la obra en cuestión, incumpléndose así con las pautas establecidas en los planes de trabajo previstos para la ejecución de la misma; y tornándose imposible el cumplimiento de plazo y obligaciones oportunamente suscriptas, LAS PARTES podrán rescindir el presente convenio de común acuerdo, renunciando recíprocamente a iniciar cualquier tipo de acción de reclamo, ya sea de carácter administrativa o judicial, en virtud del convenio que se rescinde.-----

CONVE-2017-03844408-APN-SECVYH#MI

DÉCIMA TERCERA: "EL INSTITUTO" deberá informar qué sistema de adjudicación aplicará para determinar la selección personas y/o grupos familiares que resultaren pre-adjudicatarios de las viviendas objeto del presente Convenio. Asimismo, se compromete, en un plazo no mayor a los 90 días de iniciada la obra física, a presentar a "LA SECRETARÍA" un listado con la nómina de pre-adjudicatarios.-----

DÉCIMA CUARTA: Todas las modificaciones de proyectos de la obra detallada en el ANEXO I del presente Convenio Específico, aunque no impliquen alteraciones en el monto del contrato de la obra o requerimientos adicionales de financiamiento por parte de "EL INSTITUTO", deberán ser sometidos a la consideración de "LA SECRETARÍA" con carácter previo a su ejecución.-----

DÉCIMA QUINTA: La responsabilidad de "LA SECRETARÍA" en cuanto al financiamiento es por el monto que se establece en la Cláusula TERCERA, el cual será desembolsado de conformidad con las pautas fijadas en la Cláusula CUARTA del presente Convenio. En consecuencia, no se hará cargo de eventuales sobre costos por vicios ocultos que no hubieran sido reparados por "EL INSTITUTO" en tiempo y forma.-----

DÉCIMA SEXTA: "EL INSTITUTO" se compromete a colaborar en la implementación de estrategias de animación socio-cultural para los beneficiarios del proyecto habitacional aprobado, a fin de garantizar el uso óptimo y la adecuada habitabilidad de las viviendas. -----

DÉCIMA SÉPTIMA: "LA SECRETARÍA" realizará las auditorías técnicas financieras que considere pertinente, para verificar el fiel cumplimiento del presente CONVENIO. "EL INSTITUTO" se compromete a cumplir con la obligación de poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, así como de los diferentes Órganos de Control, la totalidad de la documentación respaldatoria, incluyendo los extractos de la cuenta bancaria antes referida en los cuales se encuentren reflejados los movimientos de fondos utilizados para la ejecución de las acciones previstas, cuanto éstos así lo requieran.-----

DÉCIMA OCTAVA: "EL INSTITUTO" se compromete a cooperar activamente con la tarea del MINISTERIO DE TRABAJO, EMPLEO Y SEGURIDAD SOCIAL

CONVE-2017-03844408-APN-SECVYH#MI

DE LA NACIÓN, en cuanto a la fiscalización del cumplimiento de la legislación laboral, de la seguridad social y de verificación de las condiciones de seguridad e higiene del trabajo

DÉCIMA NOVENA: Déjese constancia que en el anuncio de la obra, "EL MUNICIPIO" deberá incluir la correspondiente identificación y/o señalética aprobada por el Estado Nacional a tal efecto.-----

VIGÉSIMA: El gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio Específico será atendido con cargo al Programa 38 (ex Programa 68) "Programa Federal de Construcción de Viviendas – Techo Digno" de la SUBSECRETARÍA DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA, Jurisdicción 30 - Actividad 02 - Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 1 - Fuente de Financiamiento 11.-----


VIGÉSIMA PRIMERA: "EL INSTITUTO" deberá cumplir con la obligación de preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo, documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados-----

VIGÉSIMA SEGUNDA: Con relación a los beneficiarios, se toma en consideración la información del SISTEMA DE IDENTIFICACIÓN NACIONAL TRIBUTARIO Y SOCIAL (SINTyS), ejecutado en el ámbito del CONSEJO NACIONAL DE COORDINACIÓN DE POLÍTICAS SOCIALES.-----


VIGÉSIMA TERCERA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente Convenio Específico, LAS PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales con competencia en lo Contencioso Administrativo Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.-----

VIGÉSIMA CUARTA: El plazo de vigencia del presente CONVENIO es de dos (2) años prorrogables pudiendo las partes rescindir el mismo en forma previa a su finalización.-----

Previa lectura, las partes intervinientes firman y suscriben 2 (DOS) ejemplares de un mismo tenor y a un solo efecto, en el lugar y la fecha que se indican al comienzo.



Cdr. Domingo Luis Amaya
Secretario de Vivienda y Hábitat del
Ministerio del Interior, Obras Públicas y
Vivienda



Miguel Ángel Grasso
Presidente del Instituto de Desarrollo
Urbano y Vivienda de la Provincia de
Santa Cruz

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

PROVINCIA: SANTA CRUZ
MUNICIPIO: RIO GALLEGOS
LOCALIDAD: RIO GALLEGOS
DENOMINACION OBRA : 35 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA - PROYECTO 8
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 35 VIVIENDAS
UBICACION EXACTA DE LA OBRA (CALLES)
PLAZO DE OBRA: 12 MESES
EMPRESA: ACRI SA

LÍNEAS DE ACCIÓN:	MONTOS
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS NACION	\$ 31.352.274,67
35 viviendas e infraestructura	
CONSTRUCCION DE VIVIENDAS PROVINCIA	\$ 0,00
TOTAL	\$ 31.352.274,67

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Descripcion	% Incidencia	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
TRABAJOS PRELIMINARES	19,63%	19,63%	6,00%										
MOVIMIENTO DE TIERRA	0,51%	0,51%	2,00%										
CIMENTOS	1,90%			1,90%	1,00%	0,80%							
CAPA AISLADORA	0,65%			0,65%	0,20%	0,63%							
MAESTRÍA EN ELEVACION	15,08%			8,00%	3,00%	5,00%	5,00%	1,00%	1,02%				
ESTRUCTURA DE RP A*	9,70%					2,00%	2,00%	2,00%	0,65%				
ESTRUCTURA METALICA (Incluye pint. y colorea)	10,14%					3,38%	3,38%	1,00%	1,00%	2,38%	3,38%		
CIERTAS	5,35%					2,91%	2,91%	2,91%	1,00%	1,00%	2,91%		
CONTRAPISOS	2,75%		1,00%										
PISOS	5,05%						1,52%						
ZÓCALOS	0,75%												
REVOQUES	5,02%											1,26%	
REVESTIMIENTO	0,11%											0,11%	
CIELORRASOS	6,30%										0,16%	3,16%	
CARPINTERÍA	8,73%											2,16%	
VIDRIOS	0,89%												
PINTURA	3,83%												
SANITARIOS - DESAGÜES CLOACALES Y VENTILACIONES	0,14%						0,14%		0,10%				
ARREFACTOS Y GRENERIA DE ASEO GENERAL	0,86%												0,86%
AGUA CORRIENTE	0,17%												
DESAGÜES PLUVIALES	1,50%												0,45%
INSTALACION ELECTICA	5,15%												4,12%
CONEXIONES ARREFACTOS ELECTRICOS	0,15%												
FINAL DE OBRA	0,98%												
% Físico por MES		18,63%	9,00%	10,33%	4,20%	8,53%	14,95%	3,04%	2,97%	3,38%	13,04%	15,50%	100,00%
% Físico ACUMULADO		25,66%	25,66%	35,99%	40,58%	47,12%	62,07%	65,11%	68,08%	71,46%	84,50%	100,00%	100,00%

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - PLAN DE TRABAJOS - ANEXO I

LÍNEAS DE ACCIÓN:		MONITOS
PROVINCIA: SANTA CRUZ		
MUNICIPIO: RIO GALLEGOS		
LOCALIDAD: RIO GALLEGOS	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias APORTE NACION	\$ 6.533.120,00
DENOMINACION OBRA : 35 VIVIENDAS E INFRAESTRUCTURA - PROYECTO 8		
CANTIDAD DE VIVIENDAS: 35 VIVIENDAS		
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA (CALLES)		
PLAZO DE OBRA: 12 MESES	Mejoramiento del Hábitat Urbano, Obras de Infraestructura y Obras Complementarias APORTE PROVINCIA	\$ 1.311.229,30
EMPRESA/ACRISA	TOTAL	\$ 7.844.349,30

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Descripción	% Inadone	MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12
Red frente provision de agua	20,00						5,00	5,00		5,00			
Energía eléctrica	25,00								10,00	5,00		5,00	5,00
Red Cloacal	30,00			10,00	5,00				5,00		5,00		
Conden cloaca viviendas	15,00										10,00	5,00	
TOTAL PROYECTO MENSUAL	100,00	0,00	0,00	10,00	5,00	0,00	5,00	5,00	15,00	10,00	20,00	20,00	10,00
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	100,00	0,00	0,00	10,00	15,00	15,00	20,00	25,00	40,00	50,00	70,00	90,00	100,00

Handwritten signature and initials in black ink, located to the right of the main table.

CONVE-2017-03844408-APN-SEC VYH#MI

PROGRAMA FEDERAL DE CONSTRUCCION DE VIVIENDAS "TECHO DIGNO" - ANEXO II
 PROVINCIA- SANTA CRUZ

Nº	Mes de Emisión	Distribución de la Odra	Cantidad Viviendas TFCU	Empresa	Nº CU	Localidad	Ubicación Catastral/Comunal/Departamental	Código de Identificación (CIC)	Línea de Acción	Apoyos	Anticipo Financiero	MES-1	MES-2	MES-3	MES-4	MES-5	MES-6	MES-7	MES-8	MES-9	MES-10	MES-11	MES-12	Total	
	ABR-18	SE-16-Acción 4 - REFORMA DE PROYECTO 3	34	CARRIZO S.R.L.A	181076	RIO DALLIGOO	01-02-03702-02-0715-0310	787000	Comunidad de Vivienda	\$ -	\$ 3.182.227,47	\$ 4.782.294,10	\$ 2.000.004,25	\$ 2.871.282,07	\$ 1.484.118,98	\$ 1.542.073,18	\$ 4.273.444,29	\$ 407.750,23	\$ 620.040,32	\$ 930.234,20	\$ 3.478.922,99	\$ 4.320.452,31	\$ -	\$ -	\$ 31.492.274,67
	ABR-19	Infraestructura para 55 Viviendas - PROYECTO 3	5	CARRIZO S.R.L.A	181010	RIO DALLIGOO	01-02-03702-02-0715-0310	787000	Miembros del PNUB: Unidad, Chile de Innovación y Competitividad	\$ -	\$ 303.313,03	\$ -	\$ -	\$ 187.043,00	\$ 270.009,48	\$ -	\$ 691.071,13	\$ 320.379,49	\$ 587.043,09	\$ 1.112.091,20	\$ 3.479.602,08	\$ 4.278.622,91	\$ -	\$ -	\$ 6.653.192,00
										\$ 304.424,02	\$ 785.541,41	\$ -	\$ -	\$ 784.824,44	\$ 303.989,72	\$ -	\$ 477.815,00	\$ 920.020,23	\$ 1.101.093,04	\$ 2.591.021,27	\$ 3.500.072,07	\$ 1.411.020,08	\$ 763.091,64	\$ 7.044.349,29	
TOTAL			39							\$ 3.785.670,47	\$ 4.782.294,10	\$ 2.000.004,25	\$ -	\$ 3.658.326,07	\$ 1.475.166,28	\$ 1.542.073,18	\$ 4.293.456,56	\$ 1.107.789,69	\$ 1.207.071,24	\$ 1.641.711,00	\$ 4.836.464,99	\$ 5.843.073,01	\$ 677.090,00	\$ -	\$ 37.695.244,07
										\$ 331.322,03	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 118.010,04	\$ 69.063,32	\$ -	\$ 177.016,00	\$ 60.000,00	\$ 118.010,04	\$ 258.021,07	\$ 258.021,07	\$ 258.021,04	\$ 118.010,04	\$ -	\$ 1.311.296,30
										\$ 3.454.348,44	\$ 4.782.294,10	\$ 2.000.004,25	\$ -	\$ 3.877.246,81	\$ 1.335.117,79	\$ 4.919.279,10	\$ 4.271.444,29	\$ 1.210.789,69	\$ 1.027.050,46	\$ 1.430.727,04	\$ 5.094.486,06	\$ 6.775.054,17	\$ 763.091,64	\$ -	\$ 30.404.024,97
										\$ 31.569.670,40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
										\$ 12.844.947,07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

Abril 2018	\$ 31.569.670,40
Abril 2019	\$ 12.844.947,07

ANEXO III

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/ U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriban las distintas SECRETARÍAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo.

Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no contraríen las obligaciones contractuales acordadas con dichos organismos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;
- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del presente reglamento;
- e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter

CONVE-2017-03844408-APN-SECVYH#MI

en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;

f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;

g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;

h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos. En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la devolución de los montos correspondientes, transcurridos DIEZ (10) días hábiles de vencido el plazo de SESENTA (60) días referido, la SECRETARÍA correspondiente solicitará la ejecución de las garantías previstas en el presente reglamento.

CONVE-2017-03844408-APN-SECVYH#MI

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.


ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibió la misma y si esta cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.



CONVE-2017-03844408-APN-SECVYH#MI

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos. Hasta que no se efectúe la correspondiente rendición de cuentas de toda suma transferida con anterioridad, no se podrán realizar nuevos desembolsos.

ARTÍCULO 11.- A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de lo estipulado en el convenio pertinente, cuando su objeto consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, vivienda y mejoramiento del hábitat, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá contratar un seguro de caución a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y a su entera satisfacción, que deberá cubrir el monto total equivalente a DOS (2) desembolsos o la cifra que represente como máximo el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total financiado y tener una vigencia de hasta SEIS (6) meses posteriores al plazo máximo estipulado para la última rendición de cuentas, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 3° del presente reglamento.


ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo.

Las partes obligadas a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, respecto a los convenios que se encuentran en ejecución al día de la fecha de publicación de la resolución que aprueba este reglamento, tienen el plazo improrrogable de TREINTA (30) días contado también desde la publicación de la resolución que aprueba el presente reglamento, para remitir la Póliza de Caución correspondiente a cada convenio conforme a lo previsto en el artículo 11 precedente, y en caso de no hacerlo se suspenderá el pago de

CONVE-2017-03844408-APN-SEC VYH#MI

los certificados correspondientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el presente reglamento.

Ante el incumplimiento total o parcial en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.

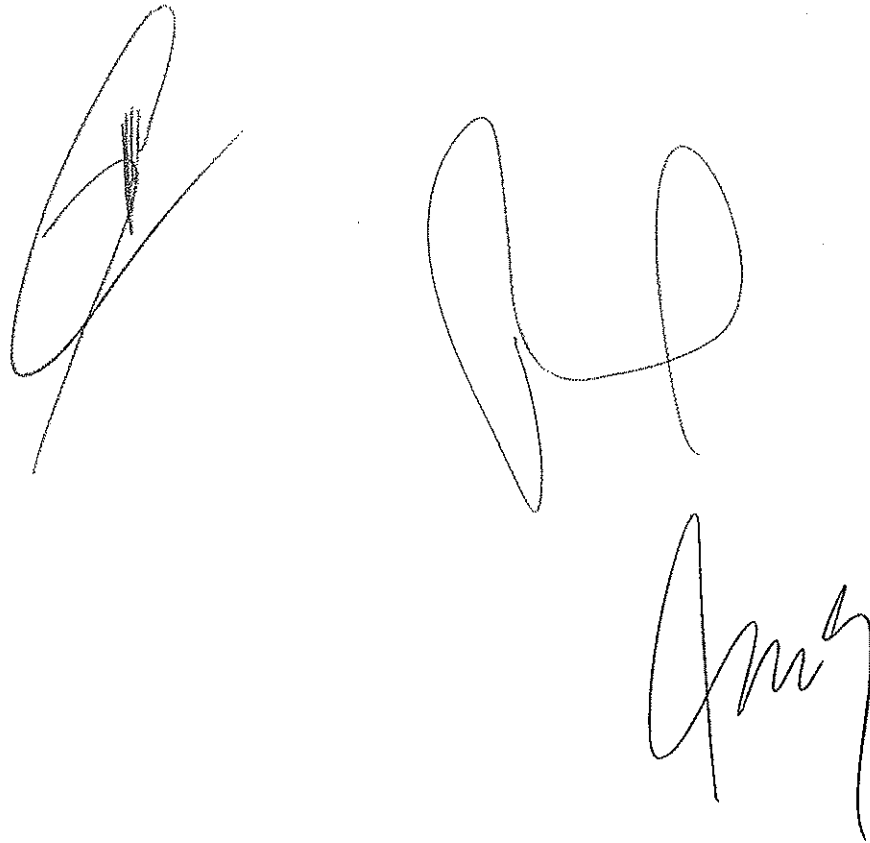Three handwritten signatures in black ink are present on the page. The first signature is on the left, the second is in the middle, and the third is on the right and lower down.
