



República Argentina - Poder Ejecutivo Nacional
2016 - Año del Bicentenario de la Declaración de la Independencia Nacional

**Hoja Adicional de Firmas
Convenio firma ológrafa**

Número: CONVE-2016-04279342-APN-SECVYH#MI

CIUDAD DE BUENOS AIRES
Miércoles 7 de Diciembre de 2016

Referencia: EXP-S020125711/2016 - HABITAT - BUENOS AIRES - CARMEN DE ARECO - BARRIO NOR ESTE/OESTE

El documento fue importado por el sistema GEDO con un total de 21 pagina/s.

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR, o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE MODERNIZACION
ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUT 30715117564
Date: 2016.12.07 13:45:40 -0300

Domingo Luis Amaya
Secretario
Secretaría de Vivienda y Hábitat
Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda

Digitally signed by GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA -
GDE
DN: cn=GESTION DOCUMENTAL ELECTRONICA - GDE, c=AR,
o=MINISTERIO DE MODERNIZACION, ou=SECRETARIA DE
MODERNIZACION ADMINISTRATIVA, serialNumber=CUT
30715117564
Date: 2016.12.07 13:40:13 -0300



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

CONVENIO ESPECÍFICO

Entre la SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT, del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, representada en este acto por el señor Secretario de Vivienda y Hábitat, Cdor. Domingo Luis AMAYA, D.N.I. N° 12.562.201, con domicilio en la calle Esmeralda N° 255, piso 8°, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, en adelante "LA SECRETARÍA" y la MUNICIPALIDAD DE CARMEN DE ARECO, representada en este acto por el Señor Intendente Dr. Marcelo Alejandro SKANSI, DNI N° 18.068.452, con domicilio en la calle Moreno N° 541 de la ciudad de Carmen de Areco, en adelante "LA MUNICIPALIDAD" y conjuntamente denominadas "LAS PARTES", acuerdan celebrar el presente Convenio Específico, y

CONSIDERANDO:

Que entre las competencias asignadas al MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA por la Ley de Ministerios N° 22.520 (T.O. por Decreto N° 438/92) y sus modificatorias, se encuentra la de entender en la elaboración y ejecución de programas de vivienda destinada a los sectores de menores recursos y promover la inversión de recursos en el campo de la vivienda.

Que asimismo, y de conformidad con lo establecido en el Decreto N° 212 del 22 de diciembre de 2015, LA SECRETARÍA tiene entre sus competencias la de entender en el diseño, implementación y control de la Política Nacional de Vivienda y entender en la elaboración, propuesta y ejecución de la política nacional en materia de obras de infraestructura habitacional y de desarrollo urbano.

Que LAS PARTES consideran apropiado llevar adelante la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento comunitario en el Barrio Noreste/ Oeste de

CONVE-2016-04279342-APN-SECVYH#MI
Dr. Marcelo A. Skansi
INTENDENTE MUNICIPAL
C.A. 11.53



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

la ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, contribuyendo de esta manera al bienestar de sus habitantes.

Que por otra parte, el MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, LA SECRETARÍA y la PROVINCIA DE BUENOS AIRES suscribieron un Convenio Marco de Colaboración con el objeto de dar solución al problema habitacional de sectores vulnerables de la sociedad en los centros con déficit de vivienda y de urbanización de barrios vulnerables con infraestructura básica, regularización dominial y fortalecimiento comunitario, logrando así la revalorización del hábitat.

Que por la cláusula tercera del referido Convenio Marco de Colaboración el señor Ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda facultó al señor Secretario de Vivienda y Hábitat a implementar las acciones necesarias a los fines de dar cumplimiento al mismo y suscribir los acuerdos específicos que resulten pertinentes.

Por ello LAS PARTES acuerdan lo siguiente:

PRIMERA: El objeto de este Convenio Específico es la ejecución de obras de infraestructura básica y fortalecimiento en el Barrio Noreste/ Oeste de la ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires, conforme al detalle obrante en el ANEXO I que forma parte integrante del presente, en el marco del Programa 37 "Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social".

SEGUNDA: Para cumplir con el objeto previsto en la cláusula primera del presente, "LA SECRETARÍA", por intermedio de la SUBSECRETARÍA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO, en adelante "LA SUBSECRETARÍA", contribuirá a aportar los fondos a los fines de afrontar el gasto que irroguen los materiales y la mano de obra necesarios para la realización de las obras a las que alude la cláusula mencionada, hasta la suma de PESOS VEINTISIETE

CONVE-2016-04279342-APN-SECVVH#MI
Dr. Marcelo A. Scazzari
INTENDENTE MUNICIPAL
M.C. 15/7



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat


MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS (\$27.642.442.-), la que será abonada a LA MUNICIPALIDAD –de existir partida presupuestaria suficiente- luego de la aprobación del gasto por parte de la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, según el Cronograma de Pagos, que se detalla en ANEXO II que forma parte integrante del presente Convenio Específico.

TERCERA: El ingreso de los recursos detallados en la cláusula segunda de la presente a LA MUNICIPALIDAD deberá ser registrado en su contabilidad como transferencia recibida del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA, de manera de garantizar la correcta afectación de tales sumas de dinero y facilitar el control del uso de los fondos.

CUARTA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a dar efectivo cumplimiento a lo previsto en el REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/U OTROS ENTES, que como Anexo I ha sido aprobado por la Resolución N° 58/16 del 23 de agosto 2016 del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y que como ANEXO III forma parte integrante del presente, conforme a lo previsto en el artículo 2° de la citada resolución.

QUINTA: LA MUNICIPALIDAD deberá iniciar las obras con sus correspondientes actas de inicio, en un plazo no mayor de TREINTA (30) días contados a partir de la fecha de recepción del primer desembolso de fondos y en caso de que no lo hiciera en el plazo estipulado, el financiamiento será cancelado, y LA MUNICIPALIDAD deberá proceder a devolver de manera inmediata las sumas percibidas en virtud del presente Convenio Específico.

SEXTA: Serán obligaciones de LA MUNICIPALIDAD:


Dr. Roberto A. Sotelo
CONVE-2016-04279342-APN-SEC-VYH#MI
M.C.doA.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

- a) Celebrar contratos de obras por la modalidad de ajuste alzado, facultando a la subcontratación de maquinarias o servicios que requieran matrícula habilitante o por la especificidad de las tareas o maquinarias; el contrato tendrá por objeto la ejecución de las obras de infraestructura comunitaria, conforme proyecto de obra, planos, detalles constructivos y análisis de costos realizados;
- b) Elaborar el proyecto ejecutivo y confeccionar los planos para la ejecución de las obras descritas en la cláusula primera del presente Convenio Específico, registrarlos ante las autoridades competentes y obtener los permisos y autorizaciones necesarios para llevar adelante las obras en tiempo y forma;
- c) Supervisar y asesorar en la compra de materiales, colaborar con el cumplimiento de las condiciones de seguridad e higiene en las obras y facilitar la ejecución estratégica del obrador y depósito de equipos y materiales;
- d) Disponer y gestionar la contratación de las maquinarias necesarias para los trabajos preliminares y para la ejecución del presente Convenio Específico, supervisar las operaciones de mensura y nivelación indispensables para el inicio de las obras, proveer luz y agua de obra y demás tareas necesarias que aseguren la correcta ejecución de las obras;
- e) Elaborar el acta de inicio, actas de cierre, entrega provisoria y definitiva de las obras;
- f) Informar a "LA SUBSECRETARÍA" el inicio, el cierre, la entrega provisoria y definitivas de las obras, dentro del plazo de SETENTA Y DOS (72) horas de que sucedan;
- g) Dar conformidad al certificado de avance de obra físico y financiero, previa constatación de la efectiva ejecución y medición de la misma en el terreno, realizar los pagos en un plazo máximo de SETENTA Y DOS (72) horas, a partir de la conformidad del certificado, e informar a LA SUBSECRETARÍA el avance y estado de obra;

CONVE-2016-04279342-APN-SECVMYH#MI
D. de Vivienda y Hábitat
M. O. P. U. C. M. U. C. A. L.
M. O. P. U. C. M. U. C. A. L.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

- h) Aportar los fondos complementarios necesarios para hacer frente a las obras en el plazo y con las calidades convenidas;
- i) Realizar los pagos de anticipos para materiales y mano de obra, conforme lo estipulado en la cláusula segunda del Convenio Específico, en un plazo no mayor de SETENTA Y DOS (72) horas a partir de la firma de los contratos de obra;
- j) Suspender los pagos cuando los contratistas incurran en irregularidades en la ejecución de las obras e informar dicha circunstancia a LA SUBSECRETARÍA en el término de CUARENTA Y OCHO (48) horas;
- k) Afrontar los gastos ocasionados por las transferencias bancarias, impuestos al cheque y gastos que demanden los movimientos de cuentas.
- l) Preservar por el término de DIEZ (10) años, como respaldo, documental de la rendición de cuentas, los comprobantes originales completados de manera indeleble y que cumplan con las exigencias establecidas por las normas impositivas y provisionales vigentes y, en su caso, en función del tipo de inversión efectuada, la presentación de la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados.

SÉPTIMA: En caso que en la ejecución de las obras intervengan cooperativas de trabajo, LA MUNICIPALIDAD deberá designar agentes responsables del seguimiento y monitoreo permanente de las diversas actividades, en particular la recepción y transmisión de la información requerida por el REGISTRO NACIONAL DE EFECTORES DE DESARROLLO LOCAL Y ECONOMÍA SOCIAL y por el INSTITUTO NACIONAL DE ASOCIATIVISMO Y DE ECONOMÍA SOCIAL (INAES).

OCTAVA: LA MUNICIPALIDAD informa su CUIT N° 30-99900353-9 y se compromete a informar dentro del plazo de QUINCE (15) días de suscripto el presente, la cuenta habilitada en la que se acreditarán los fondos que el

CONVE-2016-04279342-APN#SEC#VYH#MI
INTE...
NTE MUNICIPAL
B.C.deA.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA transferirá en función de lo previsto en la cláusula segunda de este Convenio Específico.

NOVENA: LA MUNICIPALIDAD tendrá a su cargo todas las tareas inherentes a la administración, ejecución y supervisión de las obras convenidas en la Cláusula Primera del presente, siendo la responsable exclusiva de todos los efectos resultantes de esas tareas.

DÉCIMA: LA SECRETARÍA se reserva la facultad de contralor y, en dicho marco, podrá realizar en forma directa o por intermedio de LA SUBSECRETARÍA las inspecciones de obra y auditorías técnicas, sociales y financieras que considere necesarias para verificar el cumplimiento de lo acordado en el presente. Por su parte, LA MUNICIPALIDAD se compromete a garantizar el ejercicio efectivo de esta facultad, la que no requerirá autorización, permiso o cualquier manifestación de voluntad por parte de ésta, no pudiendo obstaculizarla, ni negarse a facilitar la documentación o información que le sea requerida.

DÉCIMA PRIMERA : A los efectos de lo establecido en las cláusulas sexta y séptima, LA MUNICIPALIDAD informará a LA SUBSECRETARÍA el personal responsable de ejercer la dirección de obra y el control de gestión sobre los aspectos técnicos, sociales y contables a efecto de garantizar la gestión, colaboración y supervisión del proyecto.

DÉCIMA SEGUNDA: LA MUNICIPALIDAD se compromete a colocar un cartel de obra con la correspondiente identificación y/o señalética aprobada por LA SECRETARÍA a tal efecto. Asimismo, en toda comunicación oficial deberá mencionarse el origen de los fondos que financian la obra.

DÉCIMA TERCERA: LA MUNICIPALIDAD declara bajo juramento: a) que no tiene en trámite ante otro organismo del ESTADO NACIONAL la realización de las

CONVE-2016-042793-2-APN-SECVYH#MI
INTE MINIST. E. A. PÚBLIC. N.
del. C. de C. de C.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

obras cuya ejecución tramita por el presente; y b) que no tiene pendiente rendiciones de fondos frente al ESTADO NACIONAL, de acuerdo a la normativa vigente.

DÉCIMA CUARTA: LA MUNICIPALIDAD se obliga a mantener indemne al ESTADO NACIONAL, de y por cualquier reclamo, demanda, sanción, juicio, daño, pérdida y/o cualquier otro concepto, incluyendo multas, costos judiciales y honorarios de abogados, como consecuencia de la ejecución de las obras o por acciones relativas o tendientes al cumplimiento del presente Convenio Específico o por todas aquellas por las cuales LA MUNICIPALIDAD deba responder. A tales fines, LA MUNICIPALIDAD bajo su exclusiva responsabilidad deberá controlar que la contratista celebre y mantenga vigentes y actualizados durante la relación contractual, con entidades de máximo nivel habilitadas por la SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS DE LA NACIÓN, los siguientes Contratos de Seguros: a) Seguro de Caucción por Cumplimiento del Contrato; b) Seguro de todo Riesgo de Construcción; c) Seguro de Responsabilidad Civil Extracontractual; d) Seguro de Riesgo de Trabajo que cubra los riesgos de trabajo en los términos de la Ley N° 24557 y sus modificatorias; e) Seguro de Vida Obligatorio, Seguro de Vida de la Ley de Contrato de Trabajo, Seguro de Vida de Convenios Colectivos si lo hubiere; f) Seguro de automotores, equipos y máquinas; g) Seguro contra incendio; h) todo otro seguro que resulte obligatorio de conformidad con la normativa vigente, de acuerdo a enseres, máquinas y actividad a efectuar en la obra, sin cuya presentación no se podrá dar inicio a la ejecución de las obras.

DÉCIMA QUINTA: El gasto que demande el cumplimiento del presente Convenio Específico será atendido con cargo al Programa 37 "Acciones para la Provisión de Tierras para el Hábitat Social" de la SUBSECRETARIA DE HÁBITAT Y DESARROLLO HUMANO, Jurisdicción 30 - Actividad 01 -Inciso 5 - Partida Principal 8 - Partida Parcial 6 - Fuente de Financiamiento 11.

Dr. Ricardo A. Skansel
CONVE-2016-04279342-APN-SEC-VYH#MI
m.d.c.a.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat


DÉCIMA SEXTA: El plazo de vigencia del presente CONVENIO es de dos (2) años prorrogables, pudiendo las partes rescindir el mismo en forma previa a su finalización.

DÉCIMA SÉPTIMA: Para el caso de suscitarse alguna controversia en cuanto a la interpretación, aplicación y/o ejecución del presente Convenio Específico, LAS PARTES intentarán resolverlo en términos cordiales. De no arribar a una solución satisfactoria para ambas, acuerdan someter la cuestión a los Tribunales Federales en lo Contencioso Administrativo de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Previa lectura, las partes en prueba de conformidad, firman DOS (2) ejemplares de un mismo tenor y un solo efecto, en la Ciudad de CABA a los 5 días del mes de Diciembre de 2016.



Cdr. Domingo Luis Amaya
Secretario de Vivienda y
Hábitat del
Ministerio del Interior, Obras
Públicas y Vivienda

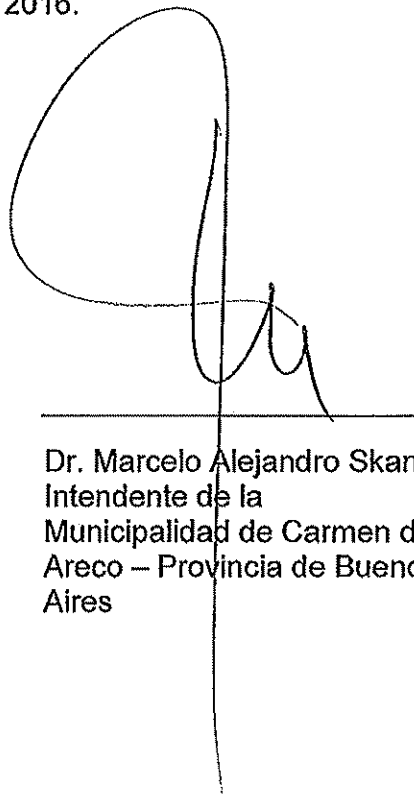

Dr. Marcelo Alejandro Skansi
Intendente de la
Municipalidad de Carmen de
Areco – Provincia de Buenos
Aires

CONVE-2016-04279342-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

ANEXO I

DETALLE DEL PROYECTO

- a) La obra consistirá en la ejecución de obras de infraestructura comunitaria en el Barrio Noreste/ Oeste de la ciudad de Carmen de Areco, Provincia de Buenos Aires.
- b) LA SECRETARÍA financiará hasta un monto total PESOS VEINTISIETE MILLONES SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS MIL CUATROCIENTOS CUARENTA Y DOS (\$27.642.442.-), de acuerdo al siguiente detalle:

Sistema de Desagües Cloacales y conexiones domiciliarias	\$ 2.449.617,00
Sistema de Desagües Pluviales	\$ 5.268.000,00
Red Vial	\$ 11.118.020,00
Red Eléctrica y Alumbrado Público	\$ 1.280.218,00
Red de Gas Natural	\$ 2.567.040,00
Equipamiento Comunitario - NIDO	\$ 2.475.411,00
Plaza de la mujer Carmeña y Playón Polideportivo	\$ 1.506.145,00
Subtotal Urbano	\$ 26.664.451,00
Módulo Desarrollo Humano - Deportivo	\$ 150.760,00
Módulo Desarrollo Humano - Verde	\$ 102.216,00
Módulo Desarrollo Humano - NIDO	\$ 507.172,00
Módulo Desarrollo Humano - Equipamiento NIDO	\$ 217.843,00
Subtotal Desarrollo Humano	\$ 977.991,00
Total	\$ 27.642.442,00

c) El plazo de obra es de OCHO (8) meses.

d) El plazo de Desarrollo Humano es de DIECISIETE (17) meses.

Dr. *[Signature]* A. Skupiel
CONVE-2016-04279342-APN-SEC VYH#MI
SECRETARÍA DE VIVIENDA Y HÁBITAT
C.A.R.E.A.



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

ANEXO II

CRONOGRAMA DE PAGOS

El desembolso que consta en la cláusula segunda del Convenio Específico será realizado según el siguiente cronograma de pago:

ETAPA I. Presupuesto 2016.

- a) 1° desembolso: PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS (\$8.292.732,60), que corresponde al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de ejecución de las obras, y será librado luego de aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.

Para esta primera etapa se afectará el presupuesto del año 2016.

ETAPA II. Presupuesto 2017.

- b) 2° desembolso: PESOS OCHO MILLONES DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS CON SESENTA CENTAVOS (\$8.292.732,60), que corresponde al TREINTA POR CIENTO (30%) del monto total de la ejecución de las obras y será librado luego de cumplido el TREINTA POR CIENTO (30%) del avance de ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.
- c) 3° desembolso: PESOS SEIS MILLONES NOVECIENTOS DIEZ MIL SEISCIENTOS DIEZ CON CINCUENTA CENTAVOS (\$6.910.610,50), que corresponde al VEINTICINCO POR CIENTO (25%) del monto total de la ejecución de las obras, y será librado luego de cumplido el SESENTA POR CIENTO (60%) del avance de la ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad competente del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.

CONVE-2016-04279342-APN-SEC-VYH#MI
INTENDENTE MUNICIPAL
Mendoza




Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

d) 4° desembolso: PESOS CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS CON TREINTA CENTAVOS (\$4.146.366,30), que corresponde al QUINCE POR CIENTO (15%) del monto total de ejecución de las obras, y será librado luego de cumplido el OCHENTA Y CINCO POR CIENTO (85%) del avance de ejecución de las obras y aprobado el gasto por la autoridad competente y del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS y VIVIENDA.

Para esta segunda etapa se afectará el presupuesto del año 2017.

A los TREINTA (30) días contados a partir del plazo de finalización de obra, LA MUNICIPALIDAD, deberá presentar el certificado físico y financiero correspondiente al CIENTO POR CIENTO (100%) de la obra y la rendición de cuentas frente a "LA SUBSECRETARÍA", según la normativa vigente.



Dr. Marcelo A. Skansi
INTENDENTE MUNICIPAL
M. C. de A.

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA - ANEXO I - URBANO

PROVINCIA:	BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	CARRIEN DE ARECO
LOCALIDAD:	CARRIEN DE ARECO
BARRIO:	NOR ESTE-OESTE
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL
DEINOMINACION DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
SUBCATEGORIA DE LA OBRA:	8
PLAZO DE OBRA (MESES):	8

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 26.684.451,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
TOTAL	\$ 26.684.451,00

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE OBRA

Descripción (Rubro e ítem)	% Inicialmente financiado	Monto Total Rubro	HOJA 1 DE 1													
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12		
Sistema de Drenación Cisternas y conexiones domiciliarias	9,197%	\$ 2.440.047,00	2,207%	2,207%	2,207%	2,207%	1,974%	0,848%	-	-	-	-	-	-	-	-
Sistema de Drenación Pluviales	19,757%	\$ 5.268.000,00	7,607%	4,098%	1,978%	1,078%	1,974%	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Vial	41,682%	\$ 11.118.020,00	20,848%	10,424%	10,424%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red Eléctrica y Alumbrado Público	4,661%	\$ 1.266.218,00	2,407%	2,407%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Red de Gas Natural	0,027%	\$ 2.007.040,00	4,814%	4,814%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Equipamiento Comunitario - NIDO	0,284%	\$ 2.475.411,00	2,021%	1,307%	1,307%	0,628%	0,028%	0,028%	-	-	-	-	-	-	-	-
Plaza de la mujer Carmelita y Playón Polvo-pavito	5,649%	\$ 1.508.145,00	2,826%	1,412%	1,412%	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROYECTO MENSUAL	100%	\$ 26.684.451,00	43,407%	27,079%	17,501%	5,501%	2,804%	1,416%	0,028%	0,028%	0,028%	0,028%	0,028%	0,028%	0,028%	0,028%
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	100%	\$ 26.684.451,00	43,407%	71,685%	88,897%	93,787%	96,891%	98,009%	98,538%	98,807%	99,009%	99,169%	99,287%	99,369%	99,421%	99,451%
% por MES	%	\$	43,407%	27,079%	17,501%	5,501%	2,804%	1,416%	0,028%	0,028%	0,028%	0,028%	0,028%	0,028%	0,028%	0,028%
% ACUMULADO	%	\$	43,407%	71,685%	88,897%	93,787%	96,891%	98,009%	98,538%	98,807%	99,009%	99,169%	99,287%	99,369%	99,421%	99,451%
\$ por MES	\$	\$	\$ 11.574.186,00	\$ 7.389.394,00	\$ 4.688.598,00	\$ 1.881.740,00	\$ 774.261,00	\$ 510.841,00	\$ 247.541,00	\$ 103.773,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
\$ por ACUMULADO	\$	\$	\$ 11.574.186,00	\$ 18.954.580,00	\$ 23.621.198,00	\$ 25.762.198,00	\$ 26.762.198,00	\$ 26.994.451,00	\$ 26.994.451,00	\$ 26.994.451,00	\$ 26.994.451,00	\$ 26.994.451,00	\$ 26.994.451,00	\$ 26.994.451,00	\$ 26.994.451,00	\$ 26.994.451,00
Aporte Nación		\$	\$ 11.574.186,00	\$ 1.830.284,00	\$ 4.264.588,00	\$ 1.388.740,00	\$ 774.261,00	\$ 510.841,00	\$ 247.541,00	\$ 103.773,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Aporte Nación	100%	\$	\$ 11.574.186,00	\$ 16.854.550,00	\$ 20.821.108,00	\$ 22.607.850,00	\$ 23.762.198,00	\$ 24.283.137,00	\$ 24.340.078,00	\$ 24.340.078,00	\$ 24.340.078,00	\$ 24.340.078,00	\$ 24.340.078,00	\$ 24.340.078,00	\$ 24.340.078,00	\$ 24.340.078,00
Aporte Provincial/Municipal	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Acumulado Aporte Provincial/Municipal	0%	\$	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	100%	\$	\$ 26.684.451,00	\$ 18.884.550,00	\$ 23.621.108,00	\$ 25.007.850,00	\$ 25.762.198,00	\$ 26.283.137,00	\$ 26.540.078,00	\$ 26.540.078,00	\$ 26.540.078,00	\$ 26.540.078,00	\$ 26.540.078,00	\$ 26.540.078,00	\$ 26.540.078,00	\$ 26.540.078,00

Solo y firma del Responsable del Ente Ejecutor

[Firma]

Dr. Marcelo A. Skansi
INTENDENTE MUNICIPAL
M.C. 684.

[Firma]

Actuaria Municipal Competente

CONVE-2016-04279342-APN-SEC-VYH#MI

Dr. Marcelo A. Skansi
INTENDENTE MUNICIPAL
M.C. 684.

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO - ANEXO 1 - DESARROLLO HUMANO

PROVINCIA:	BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	CARMEN DE ARECO
LOCALIDAD:	CARMEN DE ARECO
BARRIO:	NOR ESTE-ORESTE
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL
DESIGNACION DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	
PLAZO DE PROYECTO (MESES):	17

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APOYATE NACIONAL	\$ 977.991,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APOYATE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
TOTAL	\$ 977.991,00

MONTO

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO

Descripción (Rubro e ítem)	% Inicialmente	Monto Total Rubro	HOJA 1 DE 2															
			MES 1	MES 2	MES 3	MES 4	MES 5	MES 6	MES 7	MES 8	MES 9	MES 10	MES 11	MES 12				
Módulo Desarrollo Humano - Metodología de participación comunitaria	0,00%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Dependivo	15,41%	\$ 150.769,00	5,87%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%	0,511%
Módulo Desarrollo Humano - Cultural	0,00%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Verde	10,49%	\$ 102.216,00	-	4,47%	1,86%	1,86%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%	0,40%
Módulo Desarrollo Humano - Mujer y Habitat	0,00%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - NIDO	51,85%	\$ 527.172,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Educativo General	0,00%	\$ -	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Módulo Desarrollo Humano - Equipamiento NIDO	22,27%	\$ 217.163,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL PROYECTO BIENESAL	100%	\$ 977.991,00	5,87%	4,981%	2,40%	2,48%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	100%	\$ 977.991,00	5,87%	18,038%	13,418%	15,897%	17,738%	18,658%	19,578%	20,498%	21,418%	22,338%	23,258%	24,178%	25,098%	26,018%	26,938%	27,858%
% por MES	%	%	5,87%	4,981%	2,40%	2,48%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%	0,62%
% ACUMULADO	%	%	5,87%	18,038%	13,418%	15,897%	17,738%	18,658%	19,578%	20,498%	21,418%	22,338%	23,258%	24,178%	25,098%	26,018%	26,938%	27,858%
\$ por MES	\$	\$	57.200,00	48.716,00	24.220,00	28.220,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00	9.000,00
\$ ACUMULADO	\$	\$	57.200,00	106.976,00	131.220,00	159.476,00	168.476,00	177.476,00	186.476,00	195.476,00	204.476,00	213.476,00	222.476,00	231.476,00	240.476,00	249.476,00	258.476,00	267.476,00
Aporte Inicial		\$ 977.991,00	\$ 57.200,00	\$ 48.716,00	\$ 24.220,00	\$ 28.220,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00	\$ 9.000,00
Reembolsado Aporte Nación		\$ 877.869,00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Aporte Provincial/Municipal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	100%	\$ 977.991,00	\$ 57.200,00	\$ 106.976,00	\$ 131.220,00	\$ 159.476,00	\$ 168.476,00	\$ 177.476,00	\$ 186.476,00	\$ 195.476,00	\$ 204.476,00	\$ 213.476,00	\$ 222.476,00	\$ 231.476,00	\$ 240.476,00	\$ 249.476,00	\$ 258.476,00	\$ 267.476,00

[Signature]
 Autoridad Nacional Comunitaria

[Signature]
 Sello y Firma del Responsable del Ente Ejecutor
Dr. Marcelo A. Skansi
 INTENDENTE MUNICIPAL
 M.C. S.A.

Dr. Marcelo A. Skansi
 CONVE-2016-04279342-APN-SBOVYH#MI
 M.C. S.A.

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO - ANEXO I - DESARROLLO HUMANO

PROVINCIA:	BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	CARMEN DE ARECO
LOCALIDAD:	CARMEN DE ARECO
BARRIO:	NOR ESTE OESTE
PROGRAMA:	37 ACCIONES PARA LA PROMOCIÓN DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BASICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
UBICACIÓN EXACTA DE LA OBRA:	-
PLAZO DE PROYECTO (MESES):	17

LÍNEAS DE ACCIÓN

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE NACIONAL	\$ 977.991,00
OBRAS DE INFRAESTRUCTURA Y MEJORAMIENTO DEL HABITAT APORTE PROVINCIAL/MUNICIPAL	\$ 0,00
TOTAL	\$ 977.991,00

MONTOS

PLAN DE TRABAJO Y AVANCE DE PROYECTO

Descripción (Rubro e ítem)	HOJA 2 DE 2																
	MES 13	MES 14	MES 16	MES 10	MES 17	MES 10	MES 10	MES 20	MES 21	MES 22	MES 23	MES 24					
Módulo Desarrollo Humano - Metodología de participación comunitaria	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Módulo Desarrollo Humano - Diagnóstico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Módulo Desarrollo Humano - Cultural	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Módulo Desarrollo Humano - Verde	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Módulo Desarrollo Humano - Mujer y Habitat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Módulo Desarrollo Humano - NIDO	0,89%	3,24%	0,89%	13,31%	0,46%	-	-	-	-	-	-	-					
Módulo Desarrollo Humano - Educativo General	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Módulo Desarrollo Humano - Equipamiento NIDO	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
TOTAL PROYECTO MENSUAL	0,89%	3,24%	0,89%	13,31%	0,46%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%					
TOTAL PROYECTO ACUMULADO	81,56%	85,15%	86,02%	99,34%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%	100,00%					

	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$	%	\$
por MES	0,89%	8.590,00	3,24%	24.820,00	0,89%	8.590,00	13,31%	122.172,00	0,46%	4.509,00	0,00%	0,0000
por MES	81,56%	81.560,00	85,15%	85.150,00	86,02%	86.020,00	99,34%	993.400,00	100,00%	1000.000,00	100,00%	1000.000,00
ACUMULADO		81.560,00		85.150,00		86.020,00		993.400,00		1000.000,00		1000.000,00

	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$	\$
Aporte Nación	8.590,00	24.820,00	8.590,00	122.172,00	4.509,00	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado Aporte Nación	707.590,00	632.810,00	641.319,00	973.491,00	977.991,00	977.991,00	977.991,00	977.991,00	977.991,00	977.991,00	977.991,00	977.991,00
Aporte Provincial/Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Acumulado Aporte Provincial/Municipal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
TOTAL	8.590,00	24.820,00	8.590,00	122.172,00	4.509,00	-	-	-	-	-	-	-

[Handwritten signature]

Intendencia Municipal

Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor
DR. MERCEDES A. SKARSKI
 INTENDENTE MUNICIPAL
 P.C. 66A.

CONVE-2016-04279342-APN-SEC-VYH#MI
 INTENDENTE MUNICIPAL
 P.C. 66A.

CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DE OBRAS - ANEXO II

PROVINCIA:	BUENOS AIRES
MUNICIPIO:	CARMEN DE ARECO
LOCALIDAD:	CARMEN DE ARECO
BARRIO:	NOR ESTE-OESTE
PROGRAMA:	37 "ACCIONES PARA LA PROVISION DE TIERRAS PARA EL HABITAT SOCIAL"
DENOMINACIÓN DE LA OBRA:	INFRAESTRUCTURA BÁSICA Y FORTALECIMIENTO COMUNITARIO
UBICACION EXACTA DE LA OBRA:	-
PLAZO DE OBRA URBANO (MESES):	8
PLAZO DE PROYECTO HUMANO (MESES):	17

LINEA DE ACCION	N° ORDEN	#	CRONOGRAMA DE INVERSIÓN DE LAS OBRAS				MONTO TOTAL	
			1° DESEMBOLSO	2° DESEMBOLSO	3° DESEMBOLSO	4° DESEMBOLSO		
Infraestructura y Plan de obras	1	%	30%	30%	25%	15%	100%	
		\$	\$ 7.999.335,30	\$ 7.999.335,30	\$ 6.666.112,75	\$ 3.999.667,65	\$ 26.664.451,00	
Módulos de Desarrollo Humano	2	%	30%	30%	25%	15%	100%	
		\$	\$ 293.397,30	\$ 293.397,30	\$ 244.497,75	\$ 146.688,65	\$ 977.991,00	
TOTALES			\$	\$ 8.292.732,60	\$ 8.292.732,60	\$ 6.910.610,50	\$ 4.146.366,30	\$ 27.642.442,00

CONVE-2016-04279342-APN-SEC-VI-MMI
 Dr. Marcelo A. Skansi
 M.C.deA.



Sello y firma del Responsable del Ente Ejecutor
 Dr. Marcelo A. Skansi
 INTENDENTE MUNICIPAL
 M.C.deA.

Autoridad Nacional Competente



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

ANEXO III

REGLAMENTO GENERAL DEL MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA PARA LA RENDICIÓN DE CUENTAS DE FONDOS PRESUPUESTARIOS TRANSFERIDOS A PROVINCIAS, MUNICIPIOS Y/ U OTROS ENTES

ARTÍCULO 1°.- El presente reglamento será de aplicación en todos los convenios que suscriban las distintas SECRETARÍAS del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y sus dependencias, en los que exista una transferencia de fondos públicos y que, en consecuencia, requieran un mecanismo de rendición de cuentas a los fines de controlar la adecuación del destino de dichos fondos a lo previsto en el acuerdo respectivo. Las Unidades Ejecutoras de Programas que tengan a su cargo ejecutar programas y proyectos financiados por organismos internacionales, en materias de competencia del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA, deberán observar las disposiciones del presente reglamento, en tanto no contraríen las obligaciones contractuales acordadas con dichos organismos.

ARTÍCULO 2°.- La rendición de cuentas que se realice en el marco de los convenios referidos en el artículo 1° del presente reglamento deberá:

- a. Individualizar el organismo receptor de los fondos y los funcionarios responsables de la administración de los fondos asignados a cada cuenta bancaria receptora de los fondos;
- b. Individualizar la cuenta bancaria receptora de los fondos;
- c. Detallar el monto total de la transferencia que se rinde;

Dr. Marcelo I. Skarbil
INTENDENTE MUNICIPAL
M.C.deA.

CONVE-2016-04279342-APN-SECVYH#MI



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

- d. Acompañar copia del o los extracto/s bancario/s referidos en el artículo 3° del presente reglamento;
- e. Acompañar una planilla resumen que detalle la relación de comprobantes que respaldan la rendición de cuentas, indicando mínimamente el número de factura o recibo y los certificados de obras, de corresponder, todos debidamente conformados y aprobados por la autoridad competente, detallando el carácter en que firma, la Clave Única de Identificación Tributaria (CUIT) o la Clave Única de Identificación Laboral (CUIL) del emisor, la denominación o razón social, la fecha de emisión, el concepto, la fecha de cancelación, el número de orden de pago o cheque y los responsables de la custodia y resguardo de dicha documentación;
- f. Acompañar copia de cada uno de los comprobantes detallados en la planilla que respaldan la rendición de cuentas referida en el inciso anterior, debidamente conformados;
- g. En su caso, en función del tipo de inversión efectuada, acompañar la totalidad de los antecedentes que justifiquen la inversión de los fondos remesados;
- h. Acompañar una planilla en la que deberá indicar el avance mensual financiero previsto, el avance físico y la diferencia con el respectivo avance físico acumulado. Cuando el objeto del convenio consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, se requerirá, además de lo mencionado, la presentación de la curva de inversión y del respectivo certificado de obra. En todos los casos, dicha planilla debe estar debidamente conformada por la autoridad competente, debiendo la misma ser legible.

CONVE 2016-04279342-APN-SECVYH#MI
d.C/de



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

ARTÍCULO 3°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá presentar la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° precedente en un plazo de TREINTA (30) días hábiles, contado desde la acreditación del monto del desembolso en la cuenta bancaria correspondiente o desde el vencimiento del plazo de ejecución estipulado en el convenio.

Pasados los SESENTA (60) días hábiles contados desde el vencimiento del plazo estipulado en el párrafo anterior, mediando incumplimiento, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá devolver los montos percibidos. En caso de que el sujeto obligado no cumpla con la devolución de los montos correspondientes, transcurridos DIEZ (10) días hábiles de vencido el plazo de SESENTA (60) días referido, la SECRETARÍA correspondiente solicitará la ejecución de las garantías previstas en el presente reglamento.

Transcurridos VEINTE (20) días corridos, contados desde el vencimiento del plazo de TREINTA (30) días estipulado en el primer párrafo de este artículo, mediando incumplimiento, si la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento tuviese redeterminaciones de precio en curso, las mismas serán retenidas o interrumpidas, dejándose constancia en el expediente respectivo de la razón que motivó dicha retención o interrupción.

ARTÍCULO 4°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo

CONVE-2016-04279342-APN-SECVYH#MI
D. [Firma]
INTEN [Firma]
página 18 de 21



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

previsto en el presente reglamento, deberá conservar, por el plazo de DIEZ (10) años, contado desde la presentación de la última rendición de cuentas, los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas.

ARTÍCULO 5°.- Los comprobantes originales que respaldan la rendición de cuentas deberán ser completados de manera indeleble y cumplir con las exigencias establecidas por las normas impositivas y previsionales vigentes.

ARTÍCULO 6°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá poner a disposición de las jurisdicciones y entidades nacionales competentes, incluidos los organismos de control, la totalidad de la documentación respaldatoria de la rendición de cuentas cuando éstos así lo requieran.

ARTÍCULO 7°.- El área responsable de recibir la documentación respaldatoria detallada en el artículo 2° del presente reglamento, deberá agregar en cada expediente de pago una nota en la que detalle el estado en el que recibió la misma y si esta cumple con los requisitos mínimos previstos en el presente reglamento o en la normativa que le resulte aplicable.

ARTÍCULO 8°.- La parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá abrir una cuenta bancaria en el Banco de la Nación Argentina por cada programa o proyecto y de utilización exclusiva para este, la cual deberá reflejar las operaciones realizadas, a efectos de identificar las transacciones efectuadas en virtud del convenio correspondiente.

ARTÍCULO 9°.- En caso de acordarse un financiamiento adicional a los montos



Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat

establecidos originalmente en el convenio respectivo, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá cumplir con lo dispuesto en el mismo.

ARTÍCULO 10.- Se entenderá que la rendición de cuentas se encuentra cumplida cuando se acredite la afectación de la totalidad de los fondos transferidos. Hasta que no se efectúe la correspondiente rendición de cuentas de toda suma transferida con anterioridad, no se podrán realizar nuevos desembolsos.

ARTÍCULO 11.- A los efectos de asegurar el fiel cumplimiento de lo estipulado en el convenio pertinente, cuando su objeto consistiera en transferencias de fondos para el financiamiento de obras públicas, vivienda y mejoramiento del hábitat, la parte del convenio obligada a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, deberá contratar un seguro de caución a favor del MINISTERIO DEL INTERIOR, OBRAS PÚBLICAS Y VIVIENDA y a su entera satisfacción, que deberá cubrir el monto total equivalente a DOS (2) desembolsos o la cifra que represente como máximo el CINCO POR CIENTO (5%) del monto total financiado y tener una vigencia de hasta SEIS (6) meses posteriores al plazo máximo estipulado para la última rendición de cuentas, conforme a lo previsto en el primer párrafo del artículo 3° del presente reglamento.

ARTÍCULO 12.- Las Provincias, Municipios o Entes que tengan convenios en ejecución tienen un plazo de VEINTE (20) días desde la entrada en vigencia del presente reglamento para adecuarse al mismo.

Las partes obligadas a rendir cuentas en el marco de lo previsto en el presente reglamento, respecto a los convenios que se encuentran en ejecución al día de la


Dr. Marcelo A. Sáenz
CONVE 2016/04279342-APN-SECVYH#MI
INTE MINISTERIO MUNICIPAL
M.G. de A.



*Ministerio del Interior, Obras Públicas y Vivienda
Secretaría de Vivienda y Hábitat*

fecha de publicación de la resolución que aprueba este reglamento, tienen el plazo improrrogable de TREINTA (30) días contado también desde la publicación de la resolución que aprueba el presente reglamento, para remitir la Póliza de Caución correspondiente a cada convenio conforme a lo previsto en el artículo 11 precedente, y en caso de no hacerlo se suspenderá el pago de los certificados correspondientes hasta tanto se cumpla con lo solicitado en el presente reglamento.

Ante el incumplimiento total o parcial en la presentación de la rendición de cuentas, se comunicará a la SINDICATURA GENERAL DE LA NACIÓN, organismo actuante en el ámbito de la PRESIDENCIA DE LA NACIÓN, la existencia de tal situación y sus antecedentes, quién será la encargada de comunicarlos, de corresponder, a los órganos de control de la jurisdicción municipal o provincial de que se trate.


Dr. Marcelo A. Skansi
INTENDENTE MUNICIPAL
M.C. (e)
